

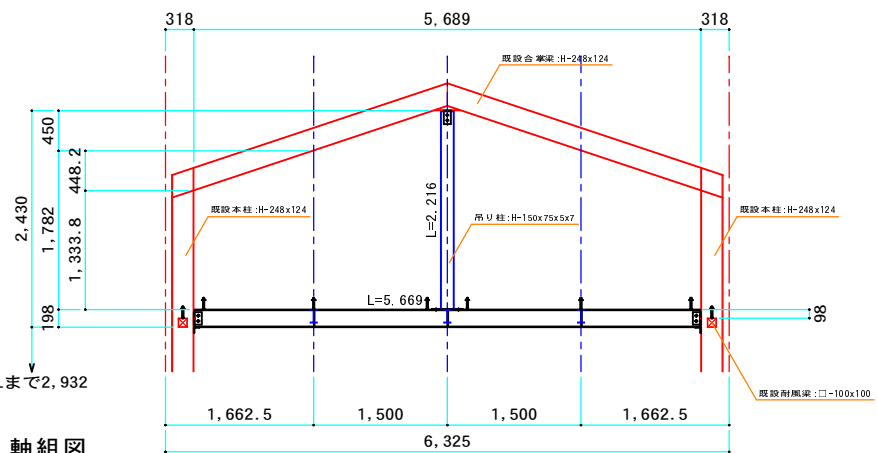



梁伏図
S=1/60 (A3)

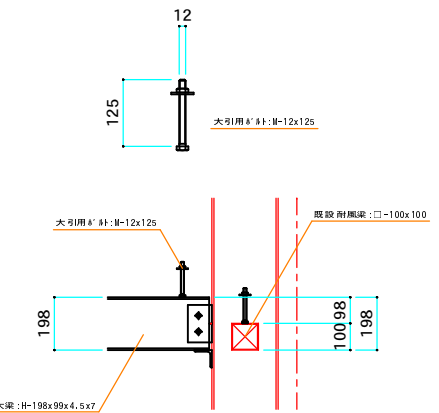

軸組図
S=1/60 (A3)

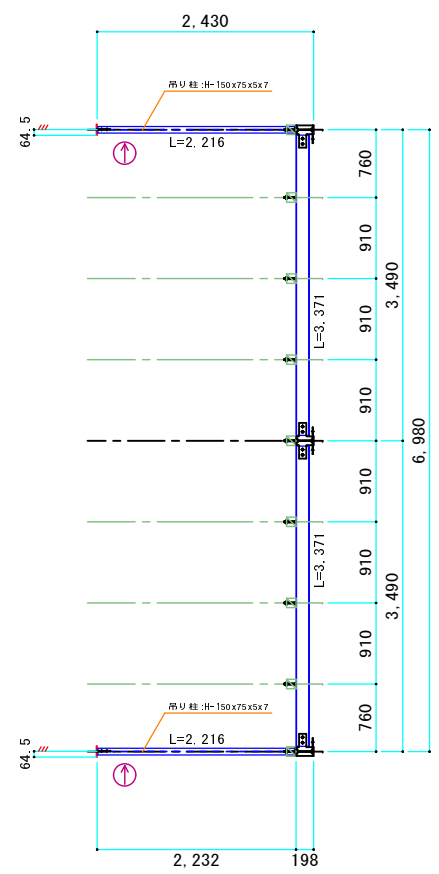

現況: 外部<北面>

現況: 内部<壁>

現況: 内部<南面>

現況: 内部<耐風梁>

現況: 内部<北面>

現況: 内部<耐風梁>

現況: 内部<屋根>

現況: 内部<耐風梁>

現況: 内部<屋根>

<工事内容>

1. 墨出し、レベル出し作業
2. 現場溶接作業
 - G、PL及び継手金物の溶接
3. 鉄骨組立
 - 3tトラック車使用で鉄骨組立
4. 現場溶接作業
 - 吊り柱のG、PL
5. 錆止め塗装
 - タッチアップ作業
6. 片付け、清掃
 - 発生材、残材の撤去処分
7. 引渡し

<工事概要>

工事名称: (株)*****様 新社屋工事 ※当社は鉄骨工事のみ担当
 工事場所: 〒****-**** 愛知県名古屋市長*****
 依頼内容: 工場内に中二階新設のための鉄骨下地工事

1. 鉄部は錆止め塗装仕上げとする<赤錆色>

工単名 (株)*****様 新社屋工事	図面名 鉄骨施工図<中二階>	印番 No-1
株式会社 友月	目付 S-1/60 (A3)	日付 2020年 2月 10日
